



# CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

|                           |                                                                  |                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Số/ No: 2303/2025/TN-ETSC | <b>PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b><br><b>CERTIFICATE OF TESTING</b> | Ngày/ Date: 29/07/2025<br>Trang/ Page: 1/2 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Khách hàng yêu cầu:<br>Customer:                                   | <b>CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GREENSKY INFINITIVE -1</b>                                                                                                                                                                            |
| 2. Địa chỉ kiểm tra:<br>Place of test:                                | Công ty TNHH Freetrend Industry A – đường số 3, KCN trong KCX Linh Trung II, Phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh                                                                                                                  |
| 3. Đối tượng kiểm tra:<br>Object:                                     | Hệ thống nối đất an toàn<br>Safe grounding system                                                                                                                                                                             |
| 4. Đặc trưng kỹ thuật:<br>Specification:                              | - Dây dẫn/ Down conductor:<br>+ Cáp đồng trần/ Copper cable                                                                                                                                                                   |
| 5. Nội dung kiểm tra:<br>Content of test:                             | Đo điện trở của hệ thống nối đất an toàn<br>Measure the resistance of the safety grounding system                                                                                                                             |
| 6. Thời gian thực hiện:<br>Date tested:                               | 29/07/2025                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn:<br>Measuring method, Standard applies: | - TN/QT-03<br>- TCVN 9358:2012                                                                                                                                                                                                |
| 8. Điều kiện môi trường:<br>Environmental conditions:                 | Trời nắng, khô ráo<br>Sunny, dry                                                                                                                                                                                              |
| 9. Thiết bị đo:<br>Measuring device:                                  | Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A/VICTOR 4105A/VICTOR 4105A                                                                                                                                                                 |
| 10. Kết quả đo:<br>Measuring result:                                  | Xem trang 2/2<br>See page 2/2                                                                                                                                                                                                 |
| 11. Kết luận:<br>Conclusion:                                          | Đạt yêu cầu<br>Meet requirements                                                                                                                                                                                              |
| 12. Kiến nghị:<br>Proposal:                                           | - Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting<br>- Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 07/2026 |

Người Thực Hiện  
Executor

Nguyễn Hoàng Thiện



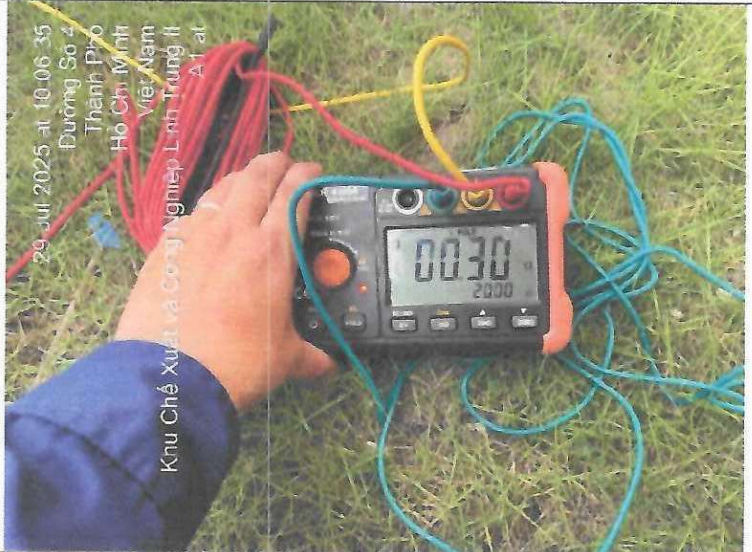
Nguyễn Quốc Hoàn



|                                                                                                   |                                                                  |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| S/N: 0315916621<br>CÔNG TY CỔ PHẦN<br>KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN<br>MIỀN BẮC<br>PHỐ HỒ CHÍ MINH | <b>PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b><br><b>CERTIFICATE OF TESTING</b> | Ngày/ Date: 29/07/2025<br>Trang/ Page: 2/2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1  
 Content of measured results 10 page 1

| Stt<br>Nº | Vị trí đo<br>Position measurement                 | Đơn vị<br>Unit | Mức tiêu chuẩn<br>Standard level | Kết quả đo<br>Measuring result | Đánh giá<br>Assess |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1         | Hệ thống nối đất an toàn<br>Safe grounding system | $\Omega$       | $\leq 4$                         | 0,3                            | Đạt/ Pass          |

| Stt<br>Nº | Vị trí đo<br>Position measurement                 | Hình ảnh giá trị đo thực tế<br>Actual measured value image                          |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Hệ thống nối đất an toàn<br>Safe grounding system |  |
